

Carta Gantt — Plan de ejecución

Inicio en la primera semana de septiembre. Al 30 de septiembre, el grueso: los dos procesos de negocio operando en producción. Durante octubre, los detalles: control documental, indicadores y los ajustes del uso real, con cierre total el 23 de octubre.

CLIENTE

Minera Escondida Limitada

PREPARADO POR

Ariel Beroíza · Consultor Senior

FECHA

20 de agosto de 2026

REFERENCIA

Cotización v2.0 (27-jul-2026), aprobada

El plan se organiza en dos etapas alineadas con la prioridad indicada por MEL: **septiembre entrega el grueso** —el proceso de chatarra de punta a punta y el de componentes obsoletos con su portal público, operando en producción— y **octubre entrega los detalles** —el repositorio documental completo, los paneles de indicadores con reportería y los ajustes que surjan del uso real—. Esta división tiene una ventaja de calidad: las fases de negocio se construyen en secuencia y con foco completo, y octubre absorbe el feedback de las primeras semanas de operación real antes del cierre.

ETAPA 1 · SEPTIEMBRE


El grueso: ambos procesos operando

Fase 1 (base técnica + chatarra completa: programa de limpieza, despachos, valorización, estados de pago y conciliación) y **Fase 3** (obsoletos: inventario, publicaciones con regla de 15 días, portal público, ofertas y adjudicación). En producción el **30 de septiembre**, con los perfiles operativos capacitados.

ETAPA 2 · OCTUBRE

Los detalles: documental, indicadores y ajustes

Fase 2 (repositorio documental completo, 9 + 14 tipos, versionado y vencimientos), **Fase 4** (paneles de indicadores y exportación Excel/PDF) y los **ajustes del uso real** de septiembre. QA integral, capacitación completa y **cierre total el viernes 23 de octubre**.

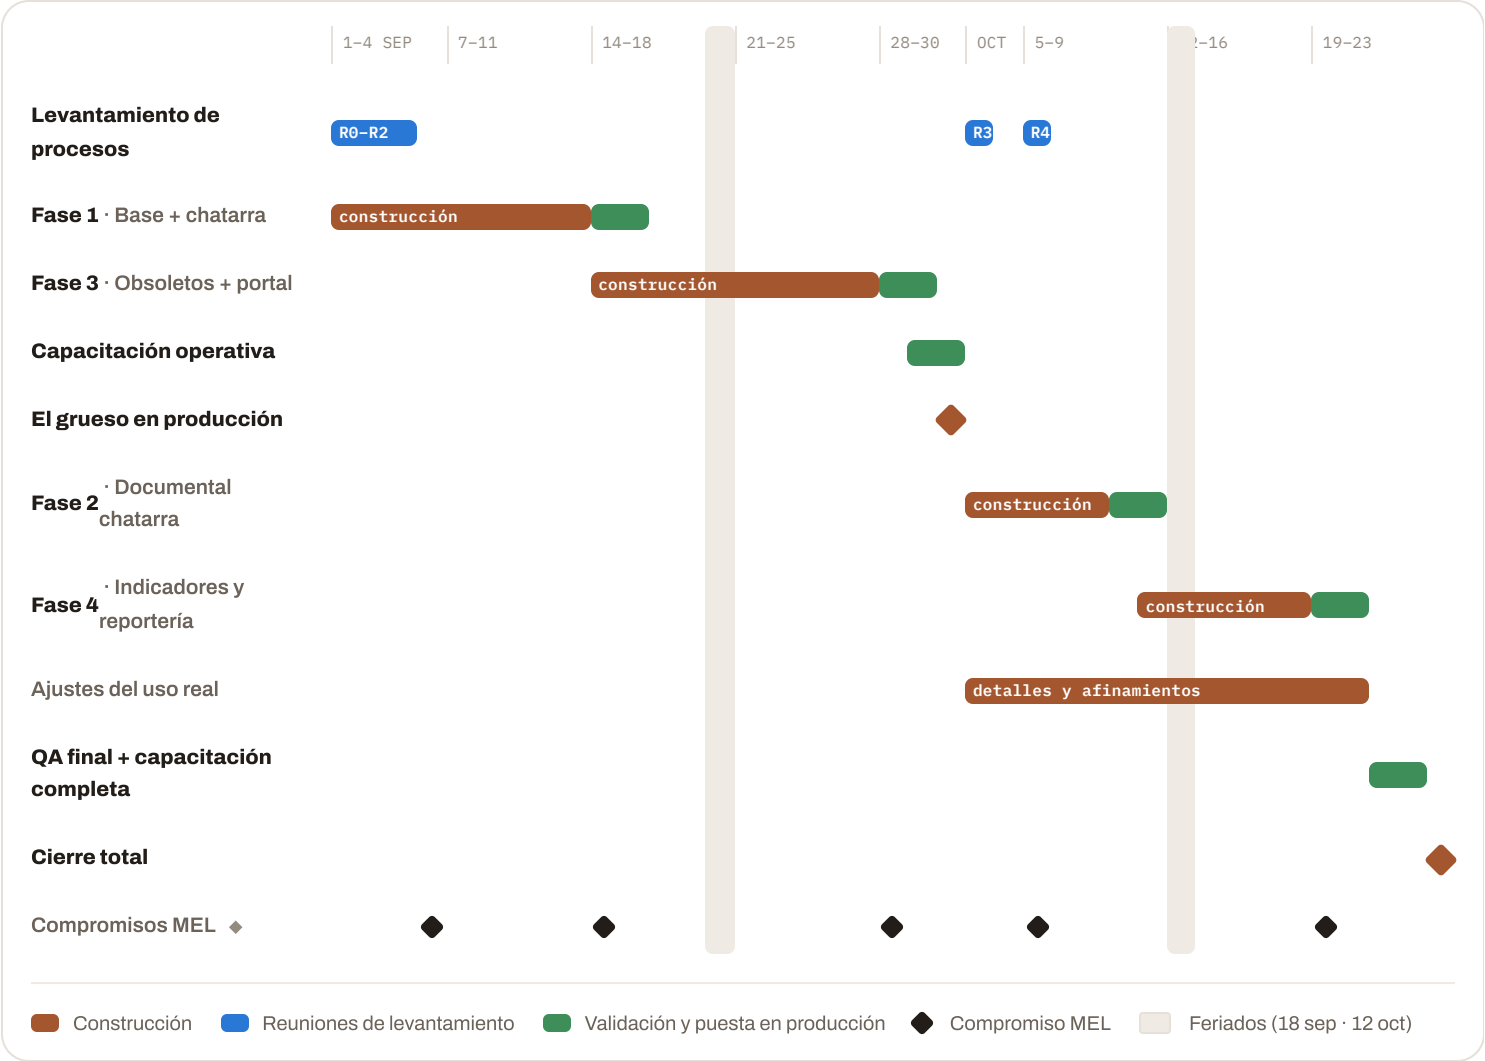

Programa de reuniones de levantamiento

Cada levantamiento llega justo antes de la fase que lo necesita: los procesos de negocio se levantan en la primera semana de septiembre; el documental y los indicadores, al abrirse octubre. Cada reunión indica los insumos que MEL debe traer (Sección 9 de la cotización); con ellos en la mesa, una sesión basta por tema.

	FECHA PROPUESTA	DURACIÓN	TEMA	ASISTENTES MEL	INSUMOS REQUERIDOS
R0	Mar 1 sep	45 min	Kickoff: contrapartes, accesos, calendario y volúmenes	Contraparte técnica y de negocio	Designación de contrapartes · volúmenes esperados de usuarios y transacciones
R1	Mié 2 sep	90 min	Proceso de chatarra: valorización, estados de pago y descuentos	Coordinador Logístico, ITO	Contratos vigentes con vendor y empresa de limpieza · tabla de categorías y precios · flujo de aprobación del EP (quién, orden, facultades, rechazo)

	FECHA PROPUESTA	DURACIÓN	TEMA	ASISTENTES MEL	INSUMOS REQUERIDOS
R2	Jue 3 sep	90 min	Obsoletos y portal: publicación, ofertas y adjudicación	Adm. Plataforma de Venta, Coordinador	Matriz de evaluación y ponderaciones · protocolo de due diligence · condiciones de venta y comisión al vendor
R3	Jue 1 oct	60 min	Control documental: tipos, vencimientos y firmantes	Coordinador, ITO, referente documental	Los 9 tipos documentales de chatarra y 14 de obsoletos con sus responsables y plazos de vencimiento
R4	Lun 5 oct	60 min	Indicadores y reportes (previo a la Fase 4)	Contraparte de negocio	Métricas y cortes de tiempo definitivos por panel · formato esperado de reportes Excel y PDF
V	Al cierre de cada fase	45 min	Validación de entregas (14 sep, 28 sep, 8 oct y 19 oct)	Contrapartes	Revisión del entregable de la fase en el ambiente de producción
C1	Mar 29 – Mié 30 sep	2 h por perfil	Capacitación operativa de los perfiles de ambos procesos	Usuarios de operación por rol	Convocatoria de los usuarios de cada perfil
C2	Mié 21 – Jue 22 oct	2 h por perfil	Capacitación completa: documental, indicadores y repaso general	Usuarios finales por rol	Convocatoria de los usuarios de cada perfil

Hitos de entrega y facturación

El orden de fases se ajusta a la prioridad de MEL (procesos primero, documental e indicadores después), facultad prevista en la Sección 10.1 de la cotización. Precios y modalidad 40/60 no cambian.

FASE	ENTREGA	VALIDACIÓN MEL	EN PRODUCCIÓN	FACTURACIÓN (SEGÚN COTIZACIÓN, 40/60)
Fase 1 · Base + chatarra	Vie 11 sep	Lun 14 sep	Mar 15 sep	Anticipo al 1 sep (junto a infraestructura) · saldo al 15 sep
Fase 3 · Obsoletos + portal	Vie 25 sep	Lun 28 sep	Mar 29 sep	Anticipo al 14 sep · saldo al 29 sep
Fase 2 · Documental chatarra	Mié 7 oct	Jue 8 oct	Vie 9 oct	Anticipo al 1 oct · saldo al 9 oct
Fase 4 · Indicadores y reportería	Vie 16 oct	Lun 19 oct	Mar 20 oct	Anticipo al 9 oct · saldo al 20 oct

Este plan complementa la Cotización v2.0 del 27 de julio de 2026 y no modifica su alcance, sus precios ni sus condiciones comerciales; reordena las fases según la facultad prevista en su Sección 10.1 (procesos de negocio primero, documental e indicadores después). Conforme a su Sección 7, las demoras en validaciones, aprobaciones o entrega de información desplazan el calendario en la misma proporción. Ariel Beroíza · beroiza.ariel@gmail.com · +56 9 9545 5073.
