

Carta Gantt — Plan de ejecución

Inicio en la primera semana de septiembre. Al 30 de septiembre, el grueso: los dos procesos de negocio operando en producción. Durante octubre, los detalles: control documental, indicadores y los ajustes del uso real, con cierre total el 23 de octubre.

CLIENTE

Sociedad de Procesamientos Industriales S.A.

PREPARADO POR

Ariel Beroíza · Ingeniero de Software

FECHA

27 de agosto de 2026

REFERENCIA

Cotización v2.0 (27-jul-2026), aprobada

El plan se organiza en dos etapas alineadas con la prioridad indicada por MEL: **septiembre entrega el grueso** —el proceso de chatarra de punta a punta y el de componentes obsoletos con su portal público, operando en producción— y **octubre entrega los detalles** —el repositorio documental completo, los paneles de indicadores con reportería y los ajustes que surjan del uso real—. Esta división tiene una ventaja de calidad: las fases de negocio se construyen en secuencia y con foco completo, y octubre absorbe el feedback de las primeras semanas de operación real antes del cierre.

ETAPA 1 · SEPTIEMBRE


El grueso: ambos procesos operando

Fase 1 (base técnica + chatarra completa: programa de limpieza, despachos, valorización, estados de pago y conciliación) y **Fase 2** (obsoletos: inventario, publicaciones con regla de 15 días, portal público, ofertas y adjudicación). En producción el **30 de septiembre**, con los perfiles operativos capacitados.

ETAPA 2 · OCTUBRE

Los detalles: documental, indicadores y ajustes

Fase 3 (repositorio documental completo, 9 + 14 tipos, versionado y vencimientos), **Fase 4** (paneles de indicadores y exportación Excel/PDF) y los **ajustes del uso real** de septiembre. QA integral, capacitación completa y **cierre total el viernes 23 de octubre**.

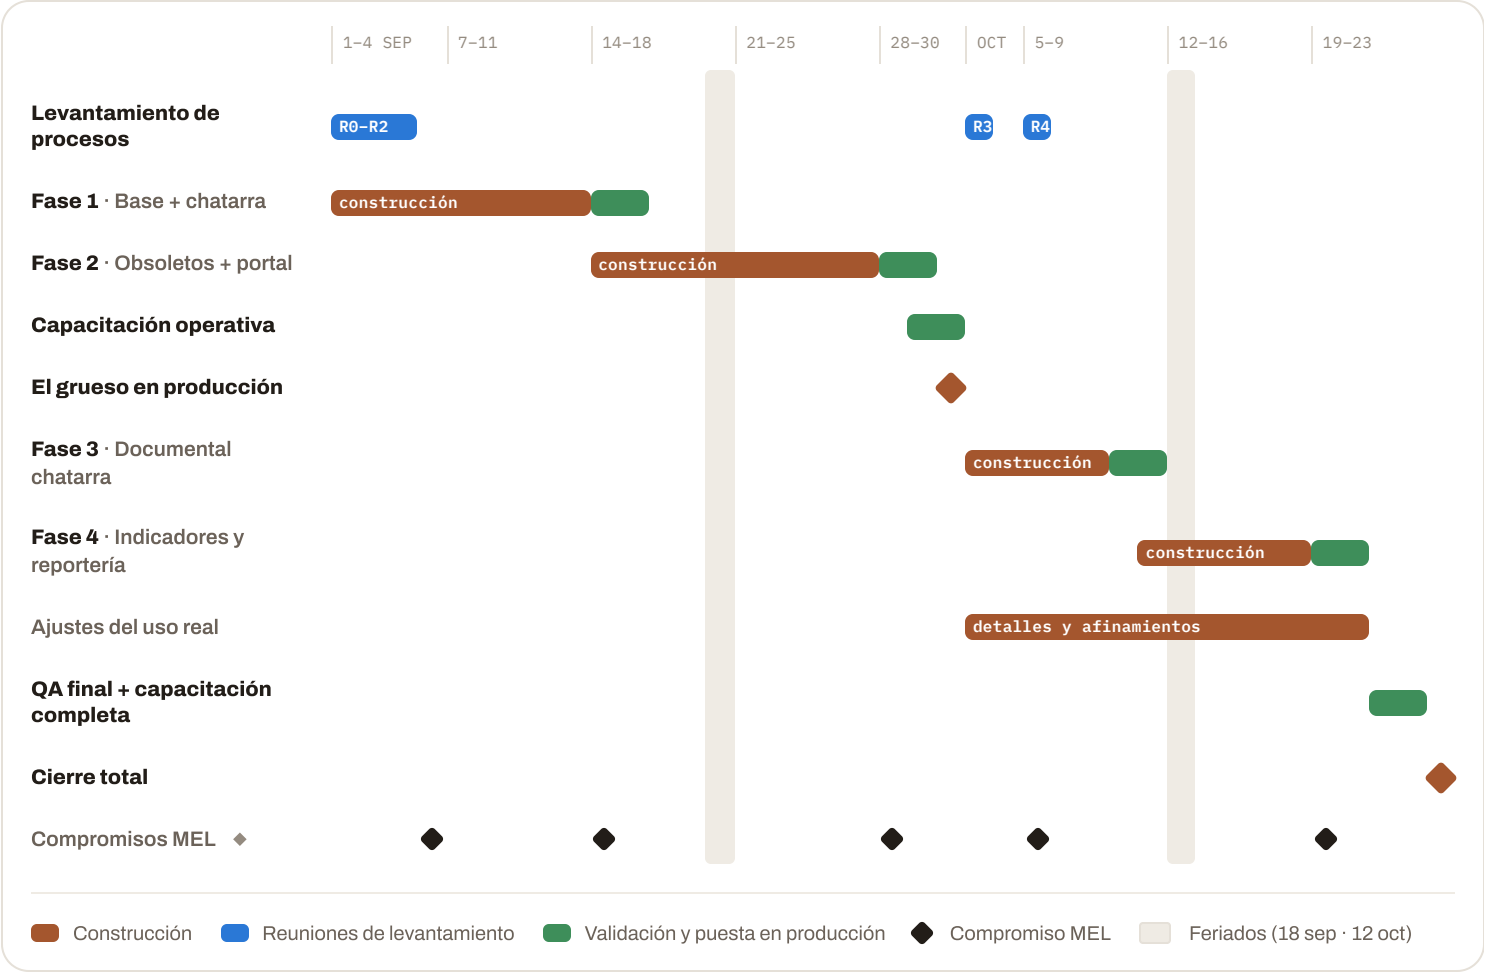

Programa de reuniones de levantamiento

Cada levantamiento llega justo antes de la fase que lo necesita: los procesos de negocio se levantan en la primera semana de septiembre; el documental y los indicadores, al abrirse octubre. Cada reunión indica los insumos que MEL debe traer (Sección 9 de la cotización); con ellos en la mesa, una sesión basta por tema.

	FECHA PROPUESTA	DURACIÓN	TEMA	ASISTENTES MEL	INSUMOS REQUERIDOS
R0	Mar 1 sep	45 min	Kickoff: contrapartes, accesos, calendario y volúmenes	Contraparte técnica y de negocio	Designación de contrapartes · volúmenes esperados de usuarios y transacciones
R1	Mié 2 sep	90 min	Proceso de chatarra: valorización, estados de pago y descuentos	Coordinador Logístico, ITO	Contratos vigentes con vendor y empresa de limpieza · tabla de categorías y precios · flujo de aprobación del EP (quién, orden, facultades, rechazo)
R2	Jue 3 sep	90 min	Obsoletos y portal: publicación, ofertas y adjudicación	Adm. Plataforma de Venta, Coordinador	Matriz de evaluación y ponderaciones · protocolo de due diligence · condiciones de venta y comisión al vendor

FECHA PROPUESTA		DURACIÓN	TEMA	ASISTENTES MEL	INSUMOS REQUERIDOS
R3	Jue 1 oct	60 min	Control documental: tipos, vencimientos y firmantes	Coordinador, ITO, referente documental	Los 9 tipos documentales de chatarra y 14 de obsoletos con sus responsables y plazos de vencimiento
R4	Lun 5 oct	60 min	Indicadores y reportes (previo a la Fase 4)	Contraparte de negocio	Métricas y cortes de tiempo definitivos por panel · formato esperado de reportes Excel y PDF
V	Al cierre de cada fase	45 min	Validación de entregas (14 sep, 28 sep, 8 oct y 19 oct)	Contrapartes	Revisión del entregable de la fase en el ambiente de producción
C1	Mar 29 – Mié 30 sep	2 h por perfil	Capacitación operativa de los perfiles de ambos procesos	Usuarios de operación por rol	Convocatoria de los usuarios de cada perfil
C2	Mié 21 – Jue 22 oct	2 h por perfil	Capacitación completa: documental, indicadores y repaso general	Usuarios finales por rol	Convocatoria de los usuarios de cada perfil

Hitos de entrega y facturación

Las fases se numeran según su orden de ejecución, ajustado a la prioridad de MEL (procesos de negocio primero, documental e indicadores después) — facultad prevista en la Sección 10.1 de la cotización. Entre paréntesis, la fase equivalente de la cotización aprobada, para trazabilidad de alcance y precios; la modalidad 40/60 no cambia.

FASE	ENTREGA	VALIDACIÓN MEL	EN PRODUCCIÓN	FACTURACIÓN (SEGÚN COTIZACIÓN, 40/60)
Fase 1 · Base + chatarra (F1 cotización)	Vie 11 sep	Lun 14 sep	Mar 15 sep	Anticipo al 1 sep (junto a infraestructura) · saldo al 15 sep
Fase 2 · Obsoletos + portal (F3 cotización)	Vie 25 sep	Lun 28 sep	Mar 29 sep	Anticipo al 14 sep · saldo al 29 sep
Fase 3 · Documental chatarra (F2 cotización)	Mié 7 oct	Jue 8 oct	Vie 9 oct	Anticipo al 1 oct · saldo al 9 oct
Fase 4 · Indicadores y reportería (F4 cotización)	Vie 16 oct	Lun 19 oct	Mar 20 oct	Anticipo al 9 oct · saldo al 20 oct

Valor hora para nuevas funcionalidades

Cerrado el desarrollo, toda nueva funcionalidad fuera del alcance de la cotización se trabaja por horas, con estimación previa aprobada por escrito. El valor hora del proyecto se mantiene para quien compromete volumen; el trabajo puntual incorpora el costo de contexto propio de solicitudes aisladas.

MODALIDAD	VALOR HORA (NETO)	CONDICIONES
Hora a demanda	\$ 30.000 + IVA	Solicitudes puntuales

MODALIDAD	VALOR HORA (NETO)	CONDICIONES
Bolsa de 20 horas	\$ 27.000 + IVA	Prepagada (\$ 540.000 neto)
Bolsa de 40 horas	\$ 25.000 + IVA	Prepagada (\$ 1.000.000 neto)
Urgencias	recargo 50%	Atención comprometida en menos de 24 horas hábiles, sobre la modalidad contratada

- **Flujo por solicitud** (mismo mecanismo de la Sección 11.5 de la cotización): solicitud → estimación en horas → aprobación por escrito → ejecución → entrega validada. Se factura la estimación aprobada, no el esfuerzo real.
- **La hora incluye** análisis, desarrollo, QA, despliegue y documentación. Cada desarrollo entregado por horas tiene **60 días de garantía**.
- **No consumen horas** los defectos cubiertos por la garantía de 90 días de cada fase del proyecto.
- **Solicitudes sobre 40 horas** se cotizan como fase con precio cerrado, bajo la misma modalidad del proyecto.
- **Vigencia:** valores válidos hasta el 31 de diciembre de 2027; reajuste anual por IPC. Facturación mensual consolidada contra reporte de horas; las bolsas se facturan al contratarse.

Propiedad del código fuente

Al término del desarrollo y pagadas las fases, el **código fuente completo** —junto con el modelo de datos, los activos de diseño y la documentación técnica— queda en **propiedad exclusiva de Sociedad de Procesamientos Industriales S.A.**, sin reserva alguna sobre la lógica de negocio ni sobre los componentes desarrollados para el proyecto, conforme a la Sección 11.4 de la cotización. En el cierre del 23 de octubre se entrega el repositorio completo y las credenciales de la infraestructura. La única excepción son las librerías de terceros de código abierto, que se rigen por sus propias licencias.

Este plan complementa la Cotización v2.0 del 27 de julio de 2026 y no modifica su alcance, sus precios ni sus condiciones comerciales; reordena las fases según la facultad prevista en su Sección 10.1 (procesos de negocio primero, documental e indicadores después). Conforme a su Sección 7, las demoras en validaciones, aprobaciones o entrega de información desplazan el calendario en la misma proporción. Ariel Beroíza · beroiza.ariel@gmail.com · +56 9 9545 5073.
